Министерство транспорта Российской Федерации
Правительство Москвы
Правительство Московской области

Перечень мероприятий, обеспечивающих транспортную доступность аэропорта «Жуковский»

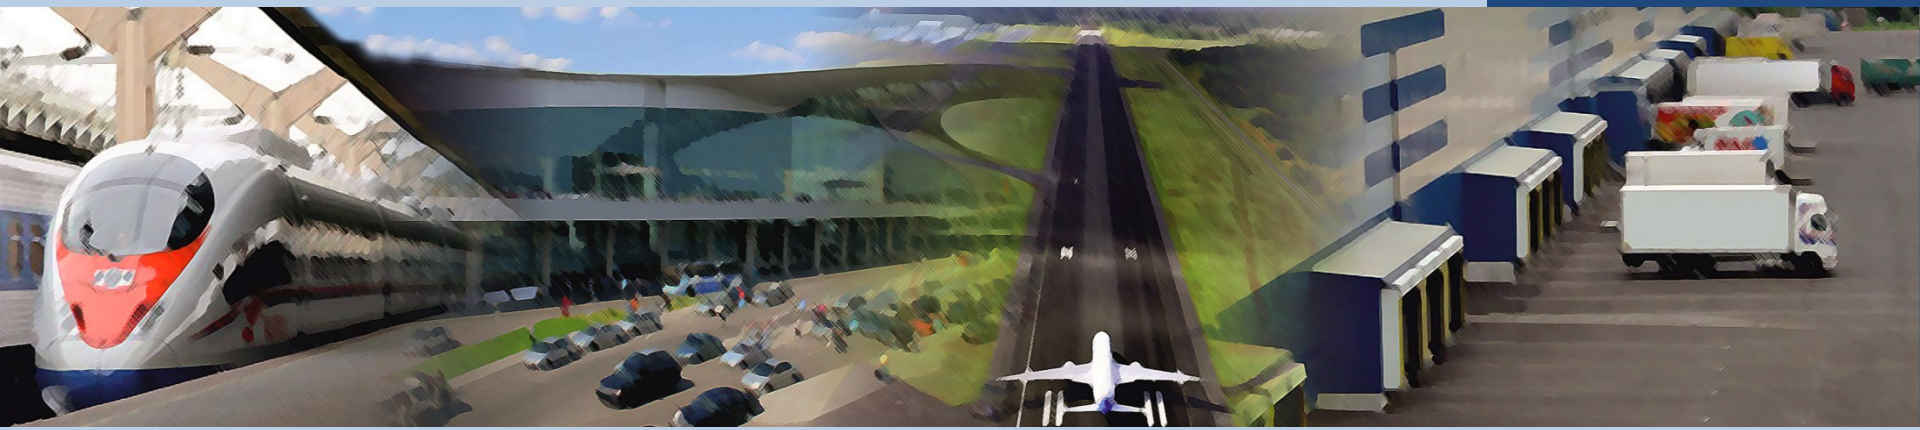

г. Москва

Схема объектов автодорожной инфраструктуры, обеспечивающих подъезд к Международному аэропорту «Жуковский»

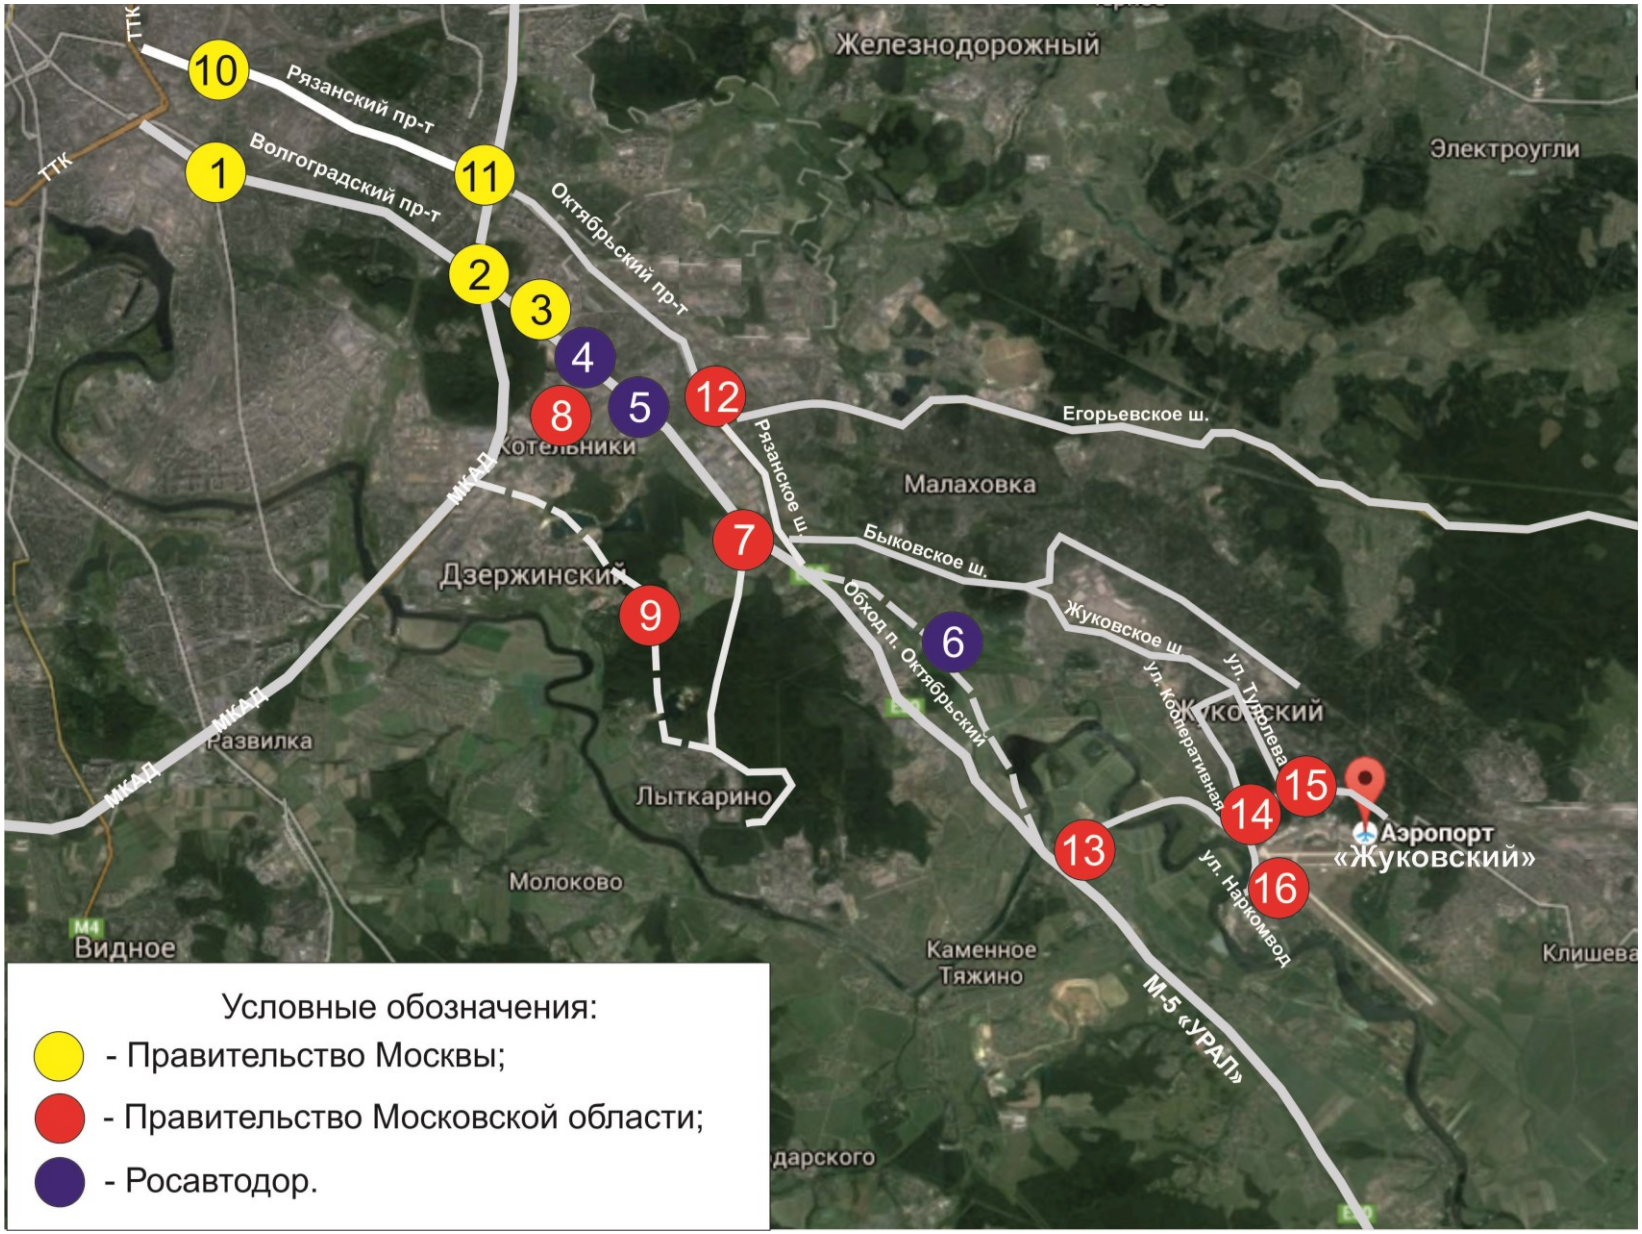

Перечень объектов автодорожной инфраструктуры, обеспечивающих подъезд Международному аэропорту «Жуковский»

п\н	Мероприятие	Натур. показат., км, кв.м	Ответственный	Общая ст-ть, млн.руб.	Срок разр. ПСД	Срок проведения экспертизы	Срок начала и заверш. СМР (целевые программы)	Средств выделено (фед.бюджет/ Москва, МО , вне бюджет. источники)	дефицит финансирования млн. руб.	Текущий статус (на дату: ММ.ГГГГ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Волгоградский проспект-М-5 «Урал»										
1	Реконструкция Волгоградского проспекта от Садового кольца до границ с Московской областью (2,3,4 этап).	9,52	Правительство Москвы	6 181,16	завершен	завершен	2014-2016	6 181,16	0,00	Строительство завершено.
2	Строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом.	6,60	Правительство Москвы	3 290,03	завершен	завершен	2013-2015	3 290,03	0,00	Строительство завершено.
3	Транспортная развязка на пересечении Новорязанского шоссе с ул. Генерала Кузнецова – ул. Маршала Полубоярова.	7,46	Правительство Москвы	4 876,93	завершен	завершен	2013-2015	4 876,93	0,00	Строительство завершено.
4	Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" на участке км 19+250 – км 28+000.	3,8	**Росавтодор**	6 505,73	завершен	завершен	2018-2020	0,00	6 505,73	Отсутствует согласование Правительства РФ на реализацию объекта.
5	Реконструкция транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска, Московская область.	2,25	**Росавтодор**	5 871,51	завершен	завершен	2010-2016	5 871,51	0,00	Реконструкция завершена.
6	Строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска на участке обхода п. Октябрьский с мостом через реку Москва км 28 – км 37, Московская область.	11,13	**Росавтодор**	31 003,81	завершен	завершен	2014-2023	7 374,36 тыс. рублей выделено в период 2014-2020 годов	23 629,45	Ведется подготовка территории для строительства. Срок завершения подготовительных работ – 2019 год. Отсутствует согласование Правительства РФ на реализацию основных СМР.
7	Строительство транспортной развязки на пересечении Лыткаринского шоссе и автомобильной дороги М-5 "Урал" в Люберецком районе Московской области.	6,84	Правительство Московской области	3 722,42	завершен	завершен	2014-2018	всего 3 722,42, в т.ч. - 3 260,91 федеральный бюджет, - 461,51 дор. фонд МО	0,00	Ведется строительство объекта.
8	Реконструкция путепровода над автодорогой М-5 "Урал" км 0,741 Лыткаринского шоссе в Люберецком районе Московской области.	0,80	Правительство Московской области	580,02	завершен	завершен	Не определен	0,02 - дорожный фонд Московской области	580,00 – федеральный бюджет	Проектно-изыскательские работы выполнены Строительно-монтажные работы не обеспечены финансированием.
9	Строительство автомобильной дороги МКАД-Дзержинский-Лыткарино.	13,70	Правительство Московской области	19 168,79	завершен	завершен	Не определен	5,61 - дорожный фонд Московской области (ПИР)	19 163,18 В том числе: - 18 205,02-фед бюджет, -958,16 бюджет МО	Заключение Главгосэкспертизы получено. Строительно-монтажные работы не обеспечены финансированием.

Перечень объектов автодорожной инфраструктуры, обеспечивающих подъезд к Международному аэропорту «Жуковский»

п\н	Мероприятие	Натур. показат., км, кв.м	Ответственный	Общая ст-ть, млн.руб.	Срок разр. ПСД	Срок проведения экспертизы	Срок начала и заверш. СМР (целевые программы)	Средств выделено (фед.бюджет/ Москва, МО , вне бюджет. источники)	дефицит финансирования млн. руб.	Текущий статус (на дату: ММ.ГГГГ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рязанский проспект- Октябрьский проспект										
10	Реконструкция Рязанского проспекта от Садового кольца до границ с Московской областью.	16,98	Правительство Москвы	9 215,86	завершен	завершен	2012-2018	9 215,86	0,00	Ведутся строительно-монтажные работы. Срок завершения работ - III кв. 2018 года
11	Строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Рязанским проспектом.	6,90	Правительство Москвы	5 137,07	завершен	завершен	2014-2018	5 137,07	0,00	Реконструкция завершена.
12	Реконструкция Октябрьского проспекта в г. Люберцы на участке граница г. Москвы - Егорьевское шоссе	6,37	Правительство Московской области	4 384,59	2017-2018	2018	2018-2022	4 384,59 - дорожный фонд Московской области	0,00	Разработка проектной документации
13	Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороги М-5 «Урал» (Московская обл, Раменский р-н, г. Жуковский).	6,590	Правительство Московской области	10 084,22	завершен	завершен	завершено	10 084,22, в т.ч. - 9 498,86 федеральный бюджет, - 585,35 дор. фонд МО	0,00	Строительно-монтажные работы завершены.
14	Строительство транспортной развязки в одном уровне на пересечении ул. Кооперативная и въезда на а/д «Подъезд к г. Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной дороги М-5 «Урал» в г. Жуковский, Московская область.	0,438	Правительство Московской области	251,88	выполнено	выполнено	2017-2018	251,88 - дорожный фонд Московской области	0,00	Ведутся строительно-монтажные работы.
15	Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский, ул. Туполева.	4,983	Правительство Московской области	7 977,18	выполнено	2017-2018	2018-2021	7 977,18 - дорожный фонд Московской области	0,00	Ведутся работы по корректировке проектной документации.
16	Реконструкция автомобильной дороги г. Жуковский, ул. Наркомвод	3,5	Правительство Московской области	2 939,02	2017-2018	2018	2018-2022	117,46 - Дорожный фонд Московской области	2 821,56 - Дорожный фонд Московской области	Ведутся работы по корректировке Проекта планировки территории и проектно-сметной документации.

п\н	Ответственный	Общая стоимость строительства объектов/млн. руб.	Средств выделено/ млн. руб.	Дефицит финансирования/ млн. руб.
1	2	3	4	5
1	Правительство Москвы	**28 701,05**	**28 701,05**	**0,00**
	Правительство Московской области	**49 108,12**	**26 543,38** в том числе: - 13 783,60 дорожный фонд Московской области; - 12 759,77 Федеральный бюджет.	**22 564,74** в том числе: - 3 779,72 дорожный фонд Московской области; - 18 785,02 Федеральный бюджет.
2	Росавтодор	**43 381,05**	**13 245,87**	**30 135,18**
3	**Итого**	**121 190,22**	**68 490,30**	**52 699,92**
